



COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITA' REGIONALE DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI DELLA STRUTTURA MISSIONE "ATTUAZIONE DELIBERA CIPE 54/2016" NN. 3/2018 E 4/2018 CON LE RISORSE FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016

REGIONE CAMPANIA

***PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LAURO:
SISTEMAZIONE DI VIA TERRA, VIA RIO E PIAZZA CASTELLO***

PROGETTO ESECUTIVO

n. documento		titolo documento		
4.3.		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		
rev.	data	descrizione	verif.	approv.
PROGETTISTA UFFICIO TECNICO COMUNE DI LAURO Arch. Diego Maria Troncone Piazza Municipio, 1 83023 Lauro (AV) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Diego Maria Troncone Piazza Municipio, 1 83023 Lauro (AV)			SCALA	
			FORMATO A4	

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Via Terra						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	2	2	05/03/2018	06/03/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	07/03/2018	08/03/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	4	09/03/2018	12/03/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	13/03/2018	14/03/2018
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	2	2	15/03/2018	16/03/2018
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	E	1	1	19/03/2018	19/03/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	20/03/2018	20/03/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	21/03/2018	21/03/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	22/03/2018	22/03/2018
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	2	4	23/03/2018	26/03/2018
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	E	3	3	27/03/2018	29/03/2018
Rimozione di massetto	1	E	2	5	30/03/2018	03/04/2018
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	3	04/04/2018	06/04/2018
Scavo a sezione obbligata	1	E	2	2	09/04/2018	10/04/2018
Posa di conduttura elettrica	1	E	2	2	11/04/2018	12/04/2018
Posa di conduttura telefonica	1	E	2	4	13/04/2018	16/04/2018
Posa di conduttura idrica	1	E	3	3	17/04/2018	19/04/2018
Posa di conduttura fognaria	1	E	4	7	20/04/2018	26/04/2018
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	4	7	27/04/2018	03/05/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	7	04/05/2018	10/05/2018
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1	E	2	4	11/05/2018	14/05/2018
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	E	3	3	15/05/2018	17/05/2018
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	1	E	3	5	18/05/2018	22/05/2018
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	3	3	23/05/2018	25/05/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	3	3	28/05/2018	30/05/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	2	2	31/05/2018	01/06/2018
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	2	2	04/06/2018	05/06/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	1	E	4	6	06/06/2018	11/06/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	12/06/2018	12/06/2018
Via Rio						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	2	2	13/06/2018	14/06/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	2	4	15/06/2018	18/06/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	2	E	2	2	19/06/2018	20/06/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1	21/06/2018	21/06/2018
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	2	E	1	1	22/06/2018	22/06/2018
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	2	E	1	1	25/06/2018	25/06/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	E	1	1	26/06/2018	26/06/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	1	1	27/06/2018	27/06/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	1	1	28/06/2018	28/06/2018

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	2	E	1	1	29/06/2018	29/06/2018
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	2	E	2	2	02/07/2018	03/07/2018
Rimozione e pulizia di pavimentazione in pietra	2	E	6	8	04/07/2018	11/07/2018
Rimozione di massetto	2	E	3	5	12/07/2018	16/07/2018
Scavo a sezione ristretta	2	E	3	3	17/07/2018	19/07/2018
Scavo a sezione obbligata	2	E	3	5	20/07/2018	24/07/2018
Posa di conduttura elettrica	2	E	2	2	25/07/2018	26/07/2018
Posa di conduttura telefonica	2	E	2	4	27/07/2018	30/07/2018
Posa di conduttura idrica	2	E	2	2	31/07/2018	01/08/2018
Posa di conduttura fognaria	2	E	3	5	02/08/2018	06/08/2018
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	2	E	2	2	07/08/2018	08/08/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	E	4	6	09/08/2018	14/08/2018
Rinfiato con sabbia eseguito a mano	2	E	2	2	16/08/2018	17/08/2018
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	2	2	20/08/2018	21/08/2018
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	2	E	4	6	22/08/2018	27/08/2018
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	2	E	3	3	28/08/2018	30/08/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2	E	3	5	31/08/2018	04/09/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2	E	3	3	05/09/2018	07/09/2018
Posa di pavimenti per esterni in pietra	2	E	5	5	10/09/2018	14/09/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	E	3	3	17/09/2018	19/09/2018
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1	20/09/2018	20/09/2018
Piazza Castello						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	2	4	21/09/2018	24/09/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	E	2	2	25/09/2018	26/09/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	3	E	2	2	27/09/2018	28/09/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	E	1	1	01/10/2018	01/10/2018
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	3	E	1	1	02/10/2018	02/10/2018
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	3	E	1	1	03/10/2018	03/10/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3	E	1	1	04/10/2018	04/10/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	E	1	1	05/10/2018	05/10/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	E	1	1	08/10/2018	08/10/2018
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	3	E	1	1	09/10/2018	09/10/2018
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	3	E	2	2	10/10/2018	11/10/2018
Rimozione di massetto	3	E	4	6	12/10/2018	17/10/2018
Scavo a sezione ristretta	3	E	3	5	18/10/2018	22/10/2018
Scavo a sezione obbligata	3	E	3	3	23/10/2018	25/10/2018
Posa di conduttura elettrica	3	E	3	5	26/10/2018	30/10/2018
Posa di conduttura telefonica	3	E	3	6	31/10/2018	05/11/2018
Posa di conduttura idrica	3	E	3	3	06/11/2018	08/11/2018
Posa di conduttura fognaria	3	E	3	5	09/11/2018	13/11/2018
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	3	E	2	2	14/11/2018	15/11/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3	E	4	6	16/11/2018	21/11/2018
Rinfiato con sabbia eseguito a mano	3	E	2	2	22/11/2018	23/11/2018
Rinterro di scavo eseguito a mano	3	E	2	2	26/11/2018	27/11/2018

Tabella Analitica Gantt

Formazione di masso per pavimentazioni esterne	3	E	5	7	28/11/2018	04/12/2018
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	3	E	3	3	05/12/2018	07/12/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	3	E	3	3	10/12/2018	12/12/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3	E	3	5	13/12/2018	17/12/2018
Posa di pavimenti per esterni in pietra	3	E	4	4	18/12/2018	21/12/2018
Posa di brecciolino	3	E	4	8	24/12/2018	31/12/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	3	E	4	6	02/01/2019	07/01/2019
Smobilizzo del cantiere	3	E	1	1	08/01/2019	08/01/2019
TOTALE GIORNI	4	E	214	310	05/03/2018	08/01/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Via Terra
- 2) = Via Rio
- 3) = Piazza Castello
- 4) = Totale


I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


- 1) = Da definire
- E <Nessuna impresa definita>


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

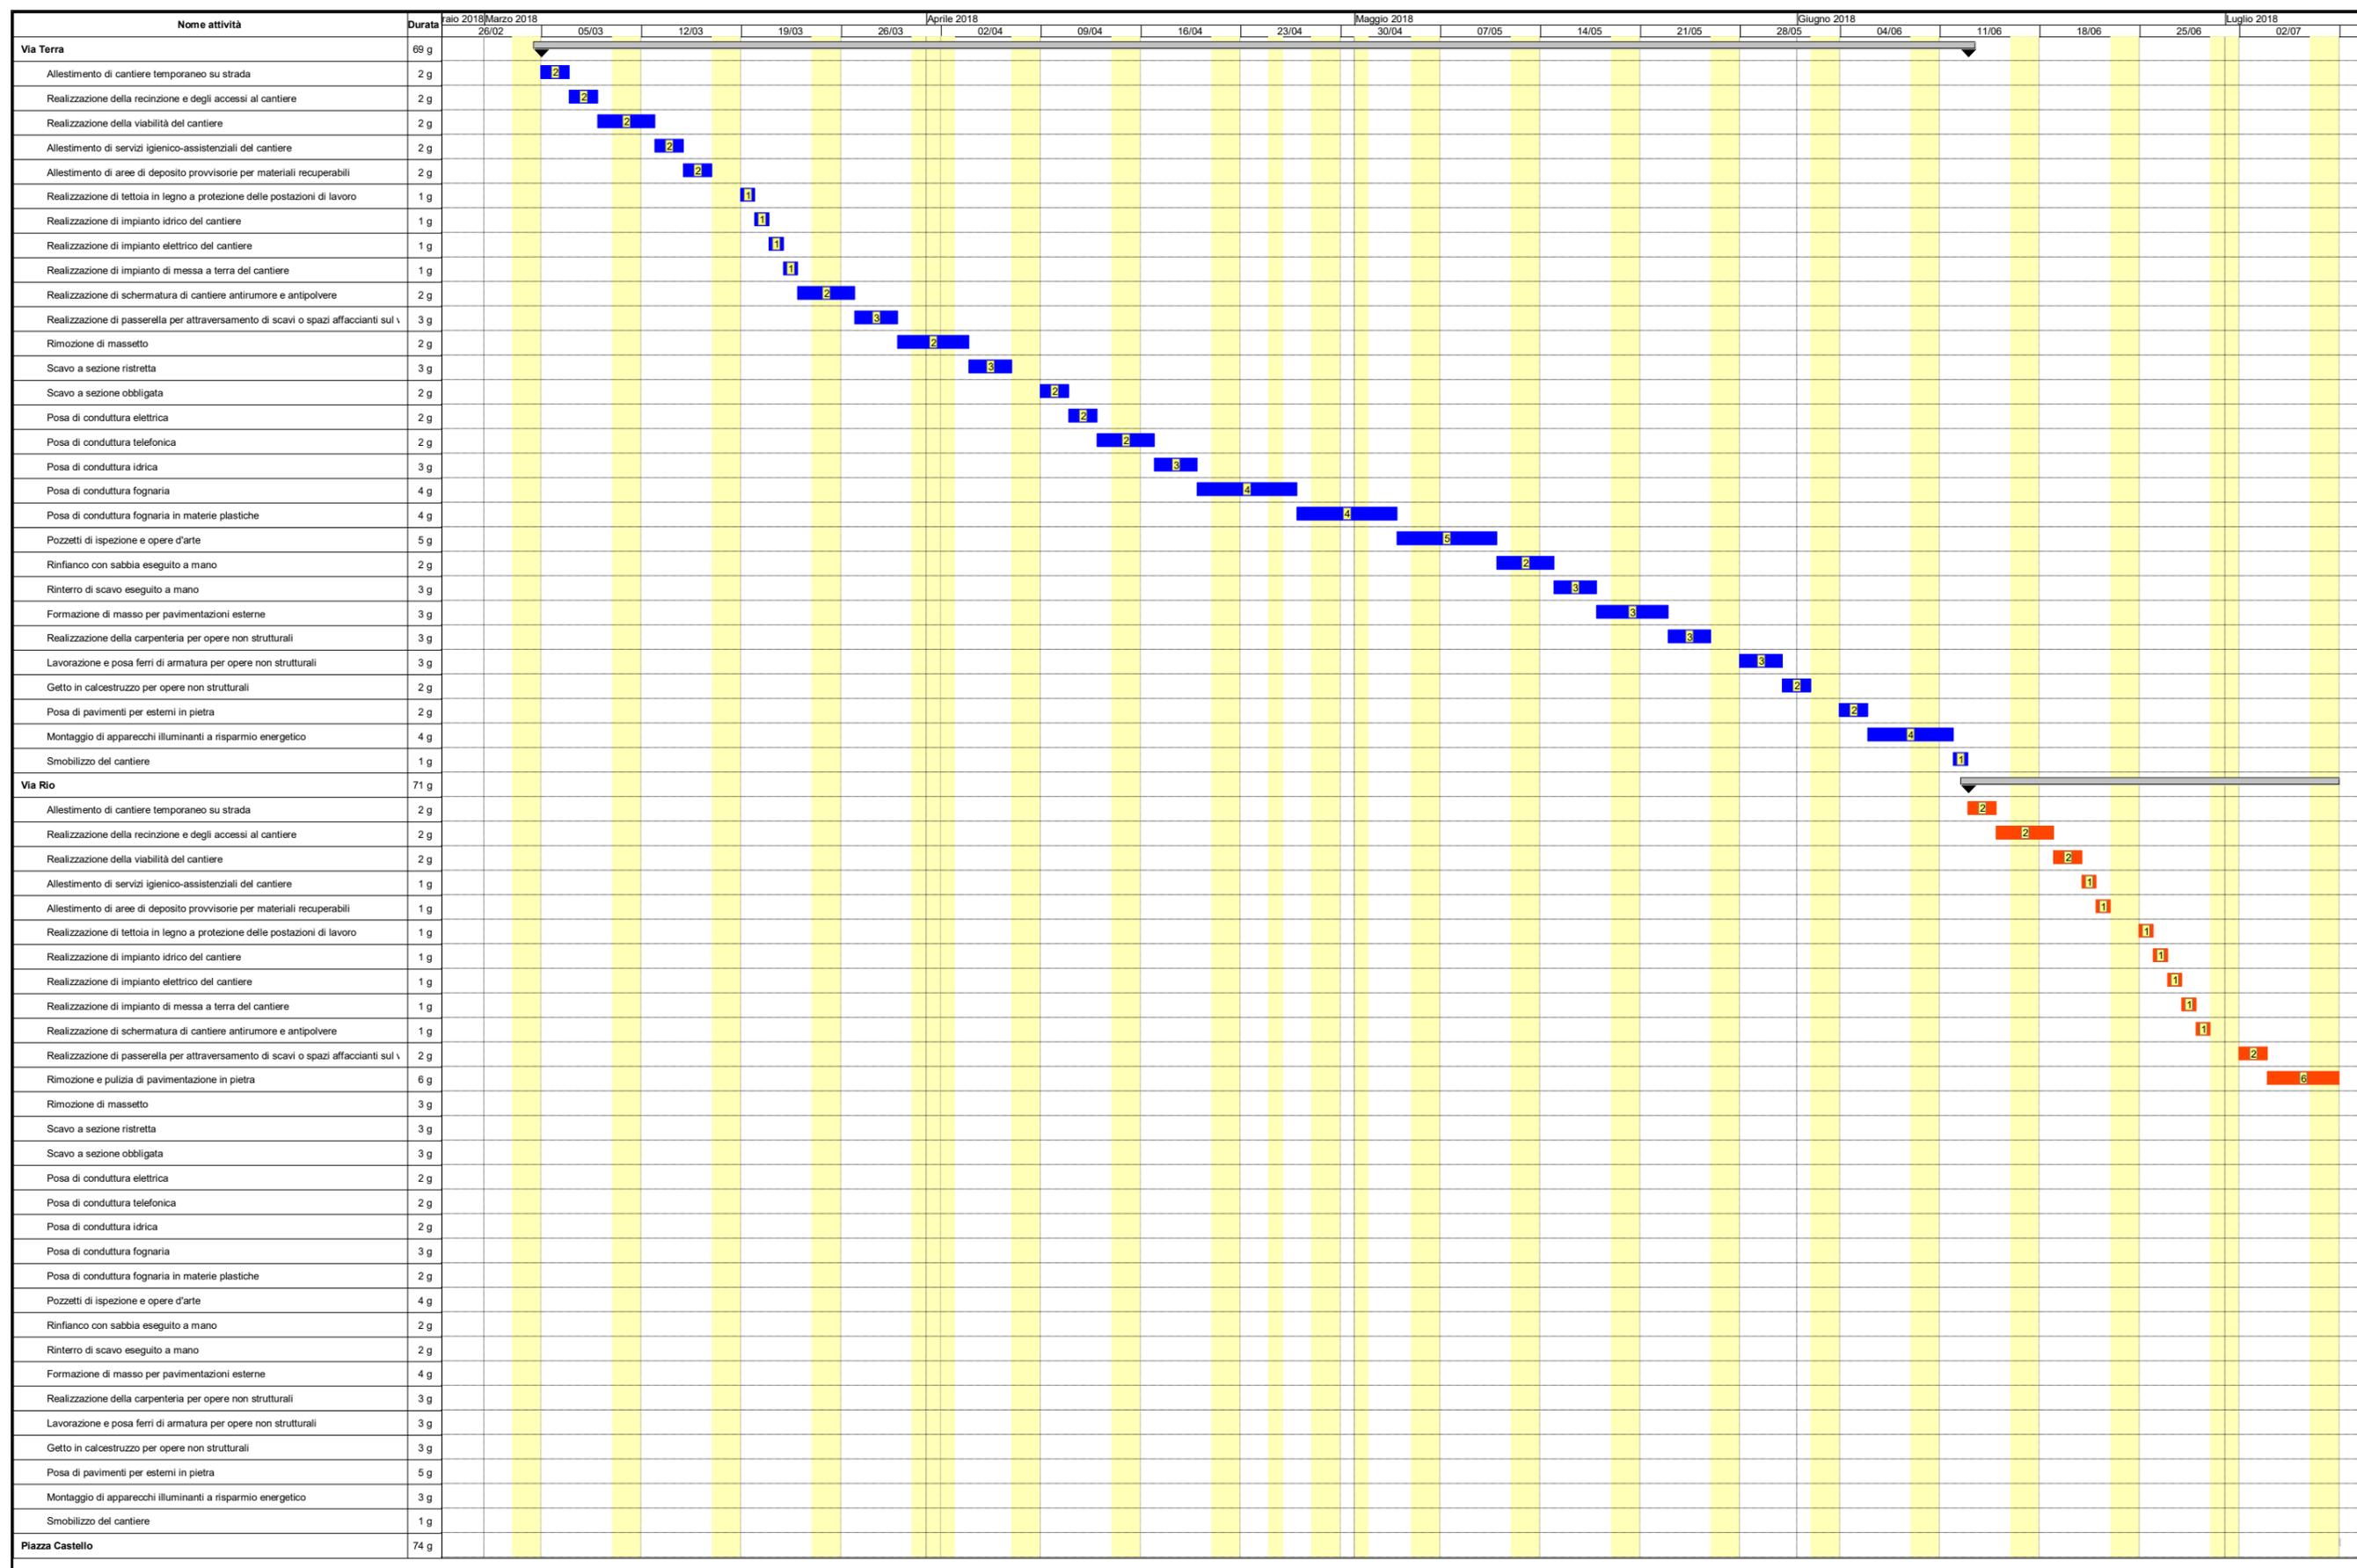

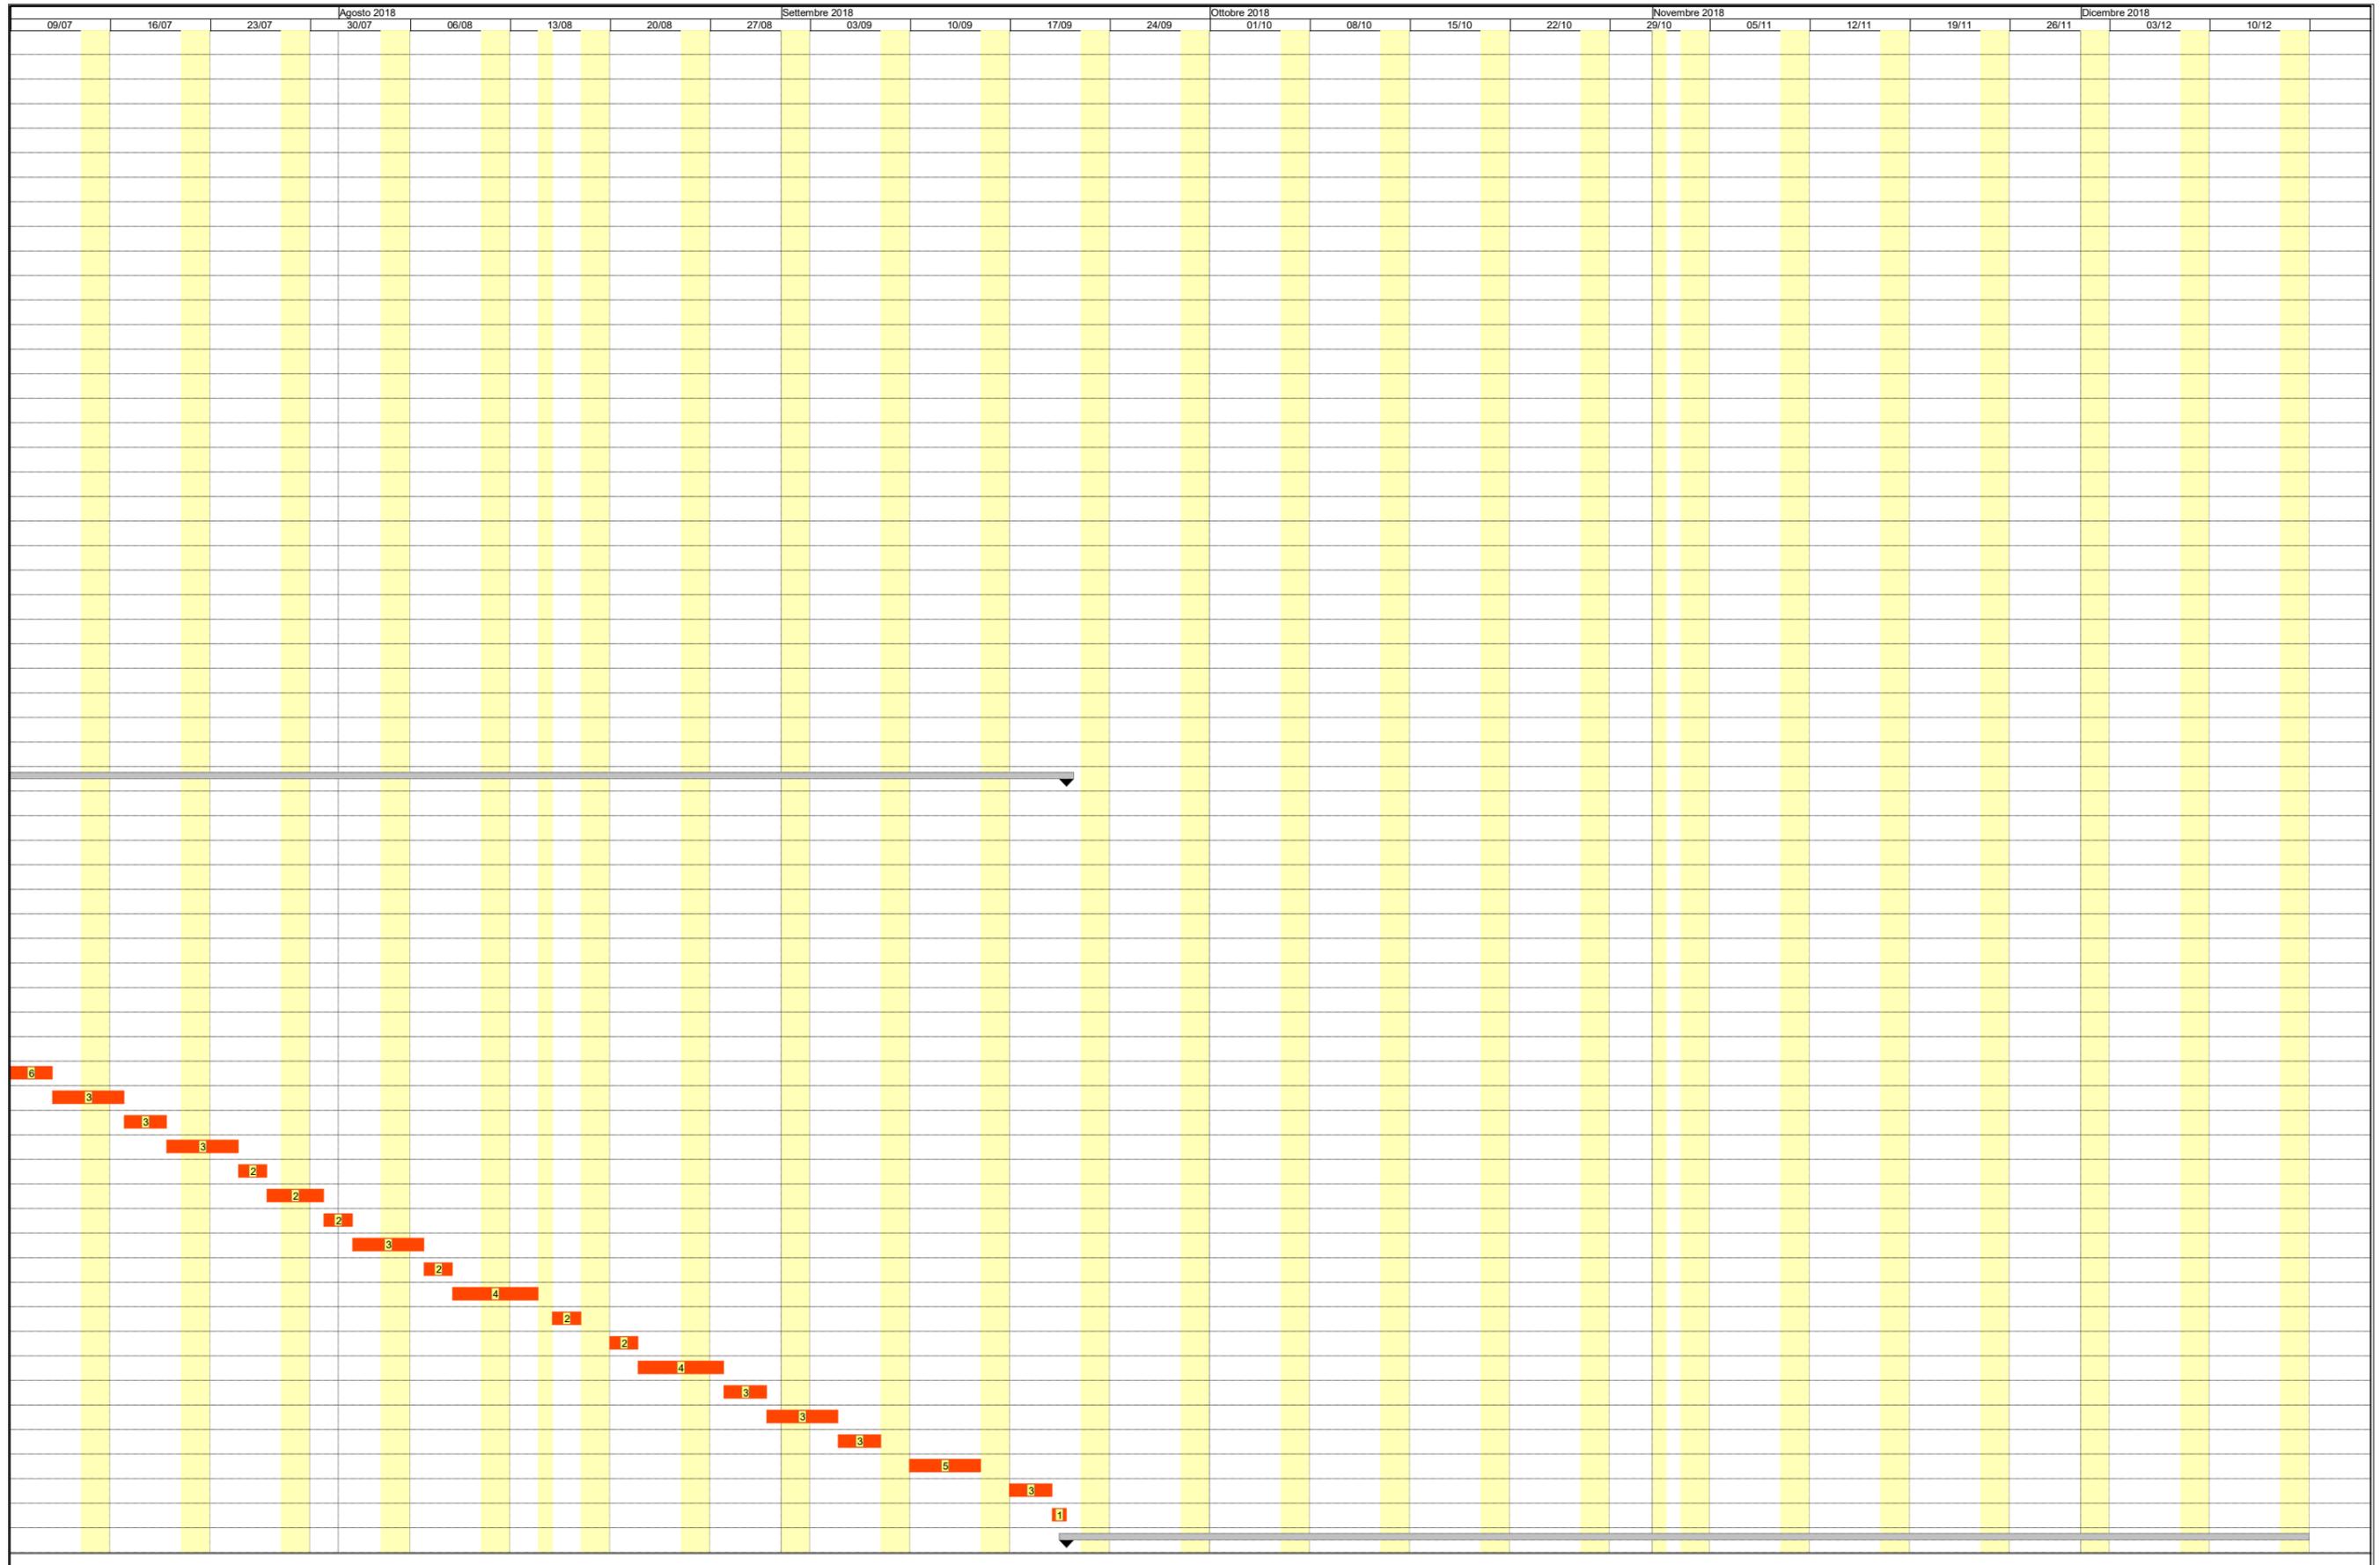

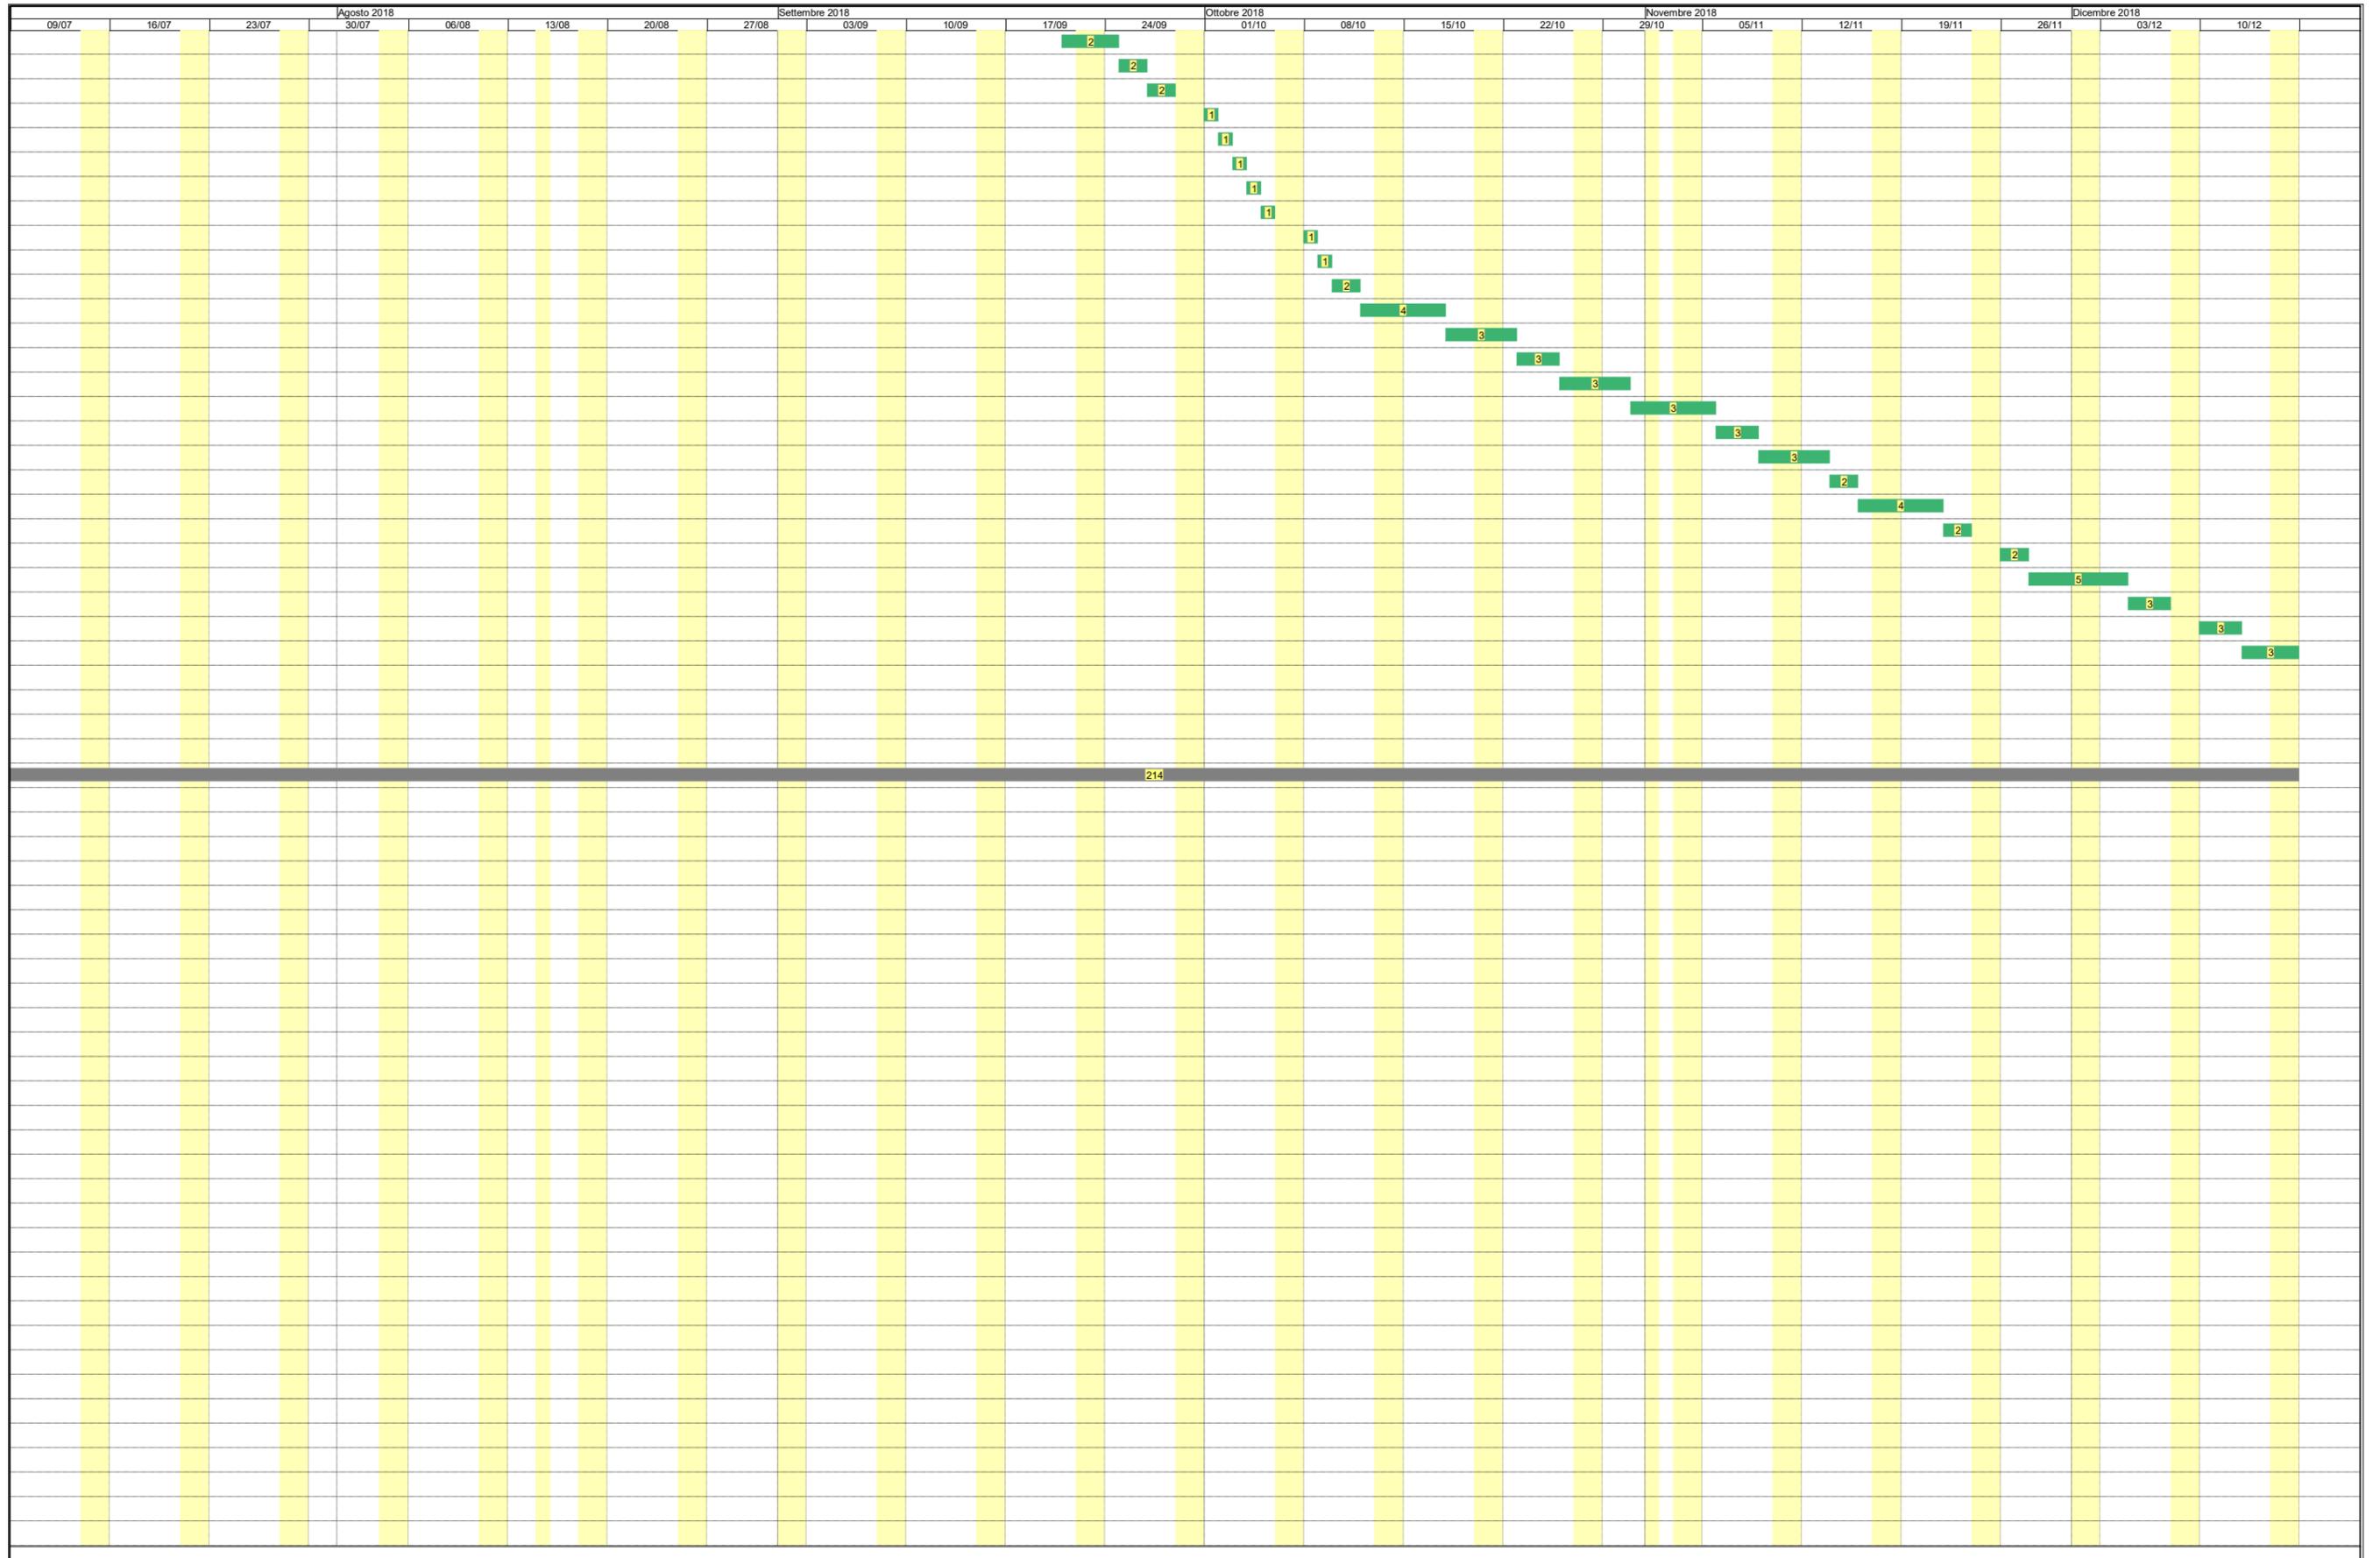

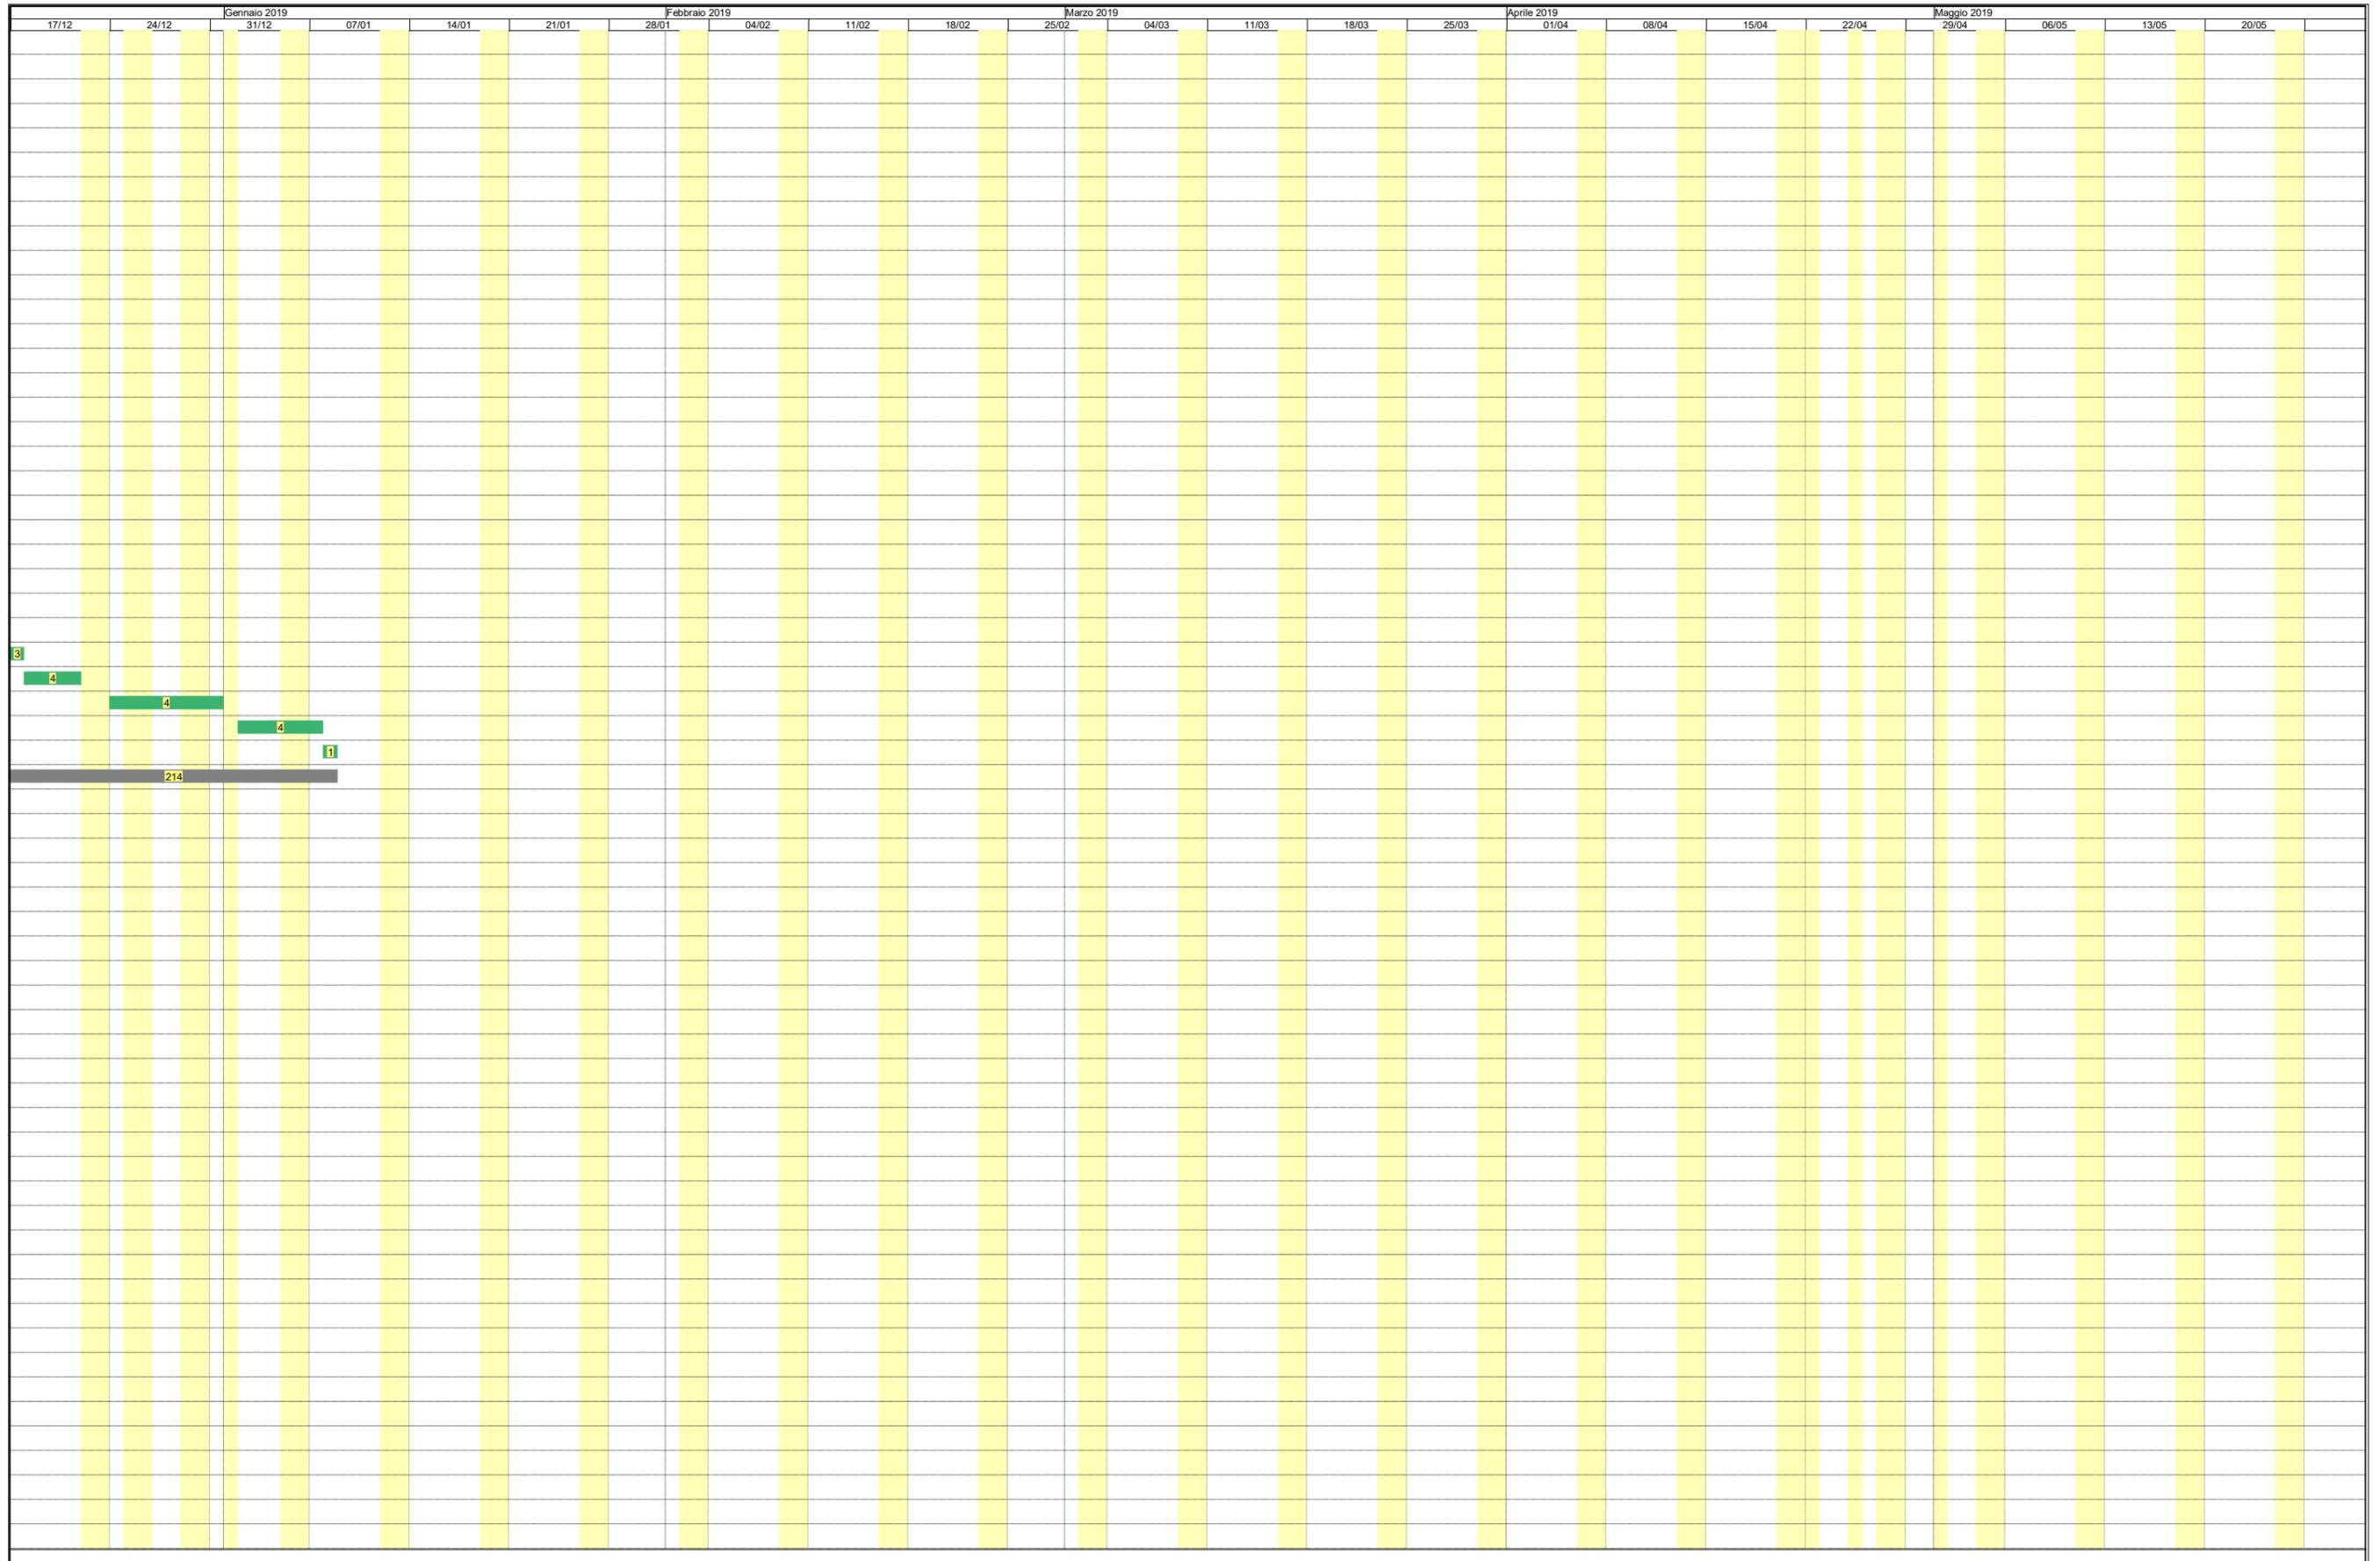

				7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217													
				1° Sett	2° Sett	3° Sett	4° Sett	5° Sett	6° Sett	7° Sett	8° Sett	9° Sett	10° Sett	11° Sett	12° Sett	13° Sett	14° Sett	15° Sett	16° Sett	17° Sett	18° Sett	19° Sett	20° Sett	21° Sett	22° Sett	23° Sett	24° Sett	25° Sett	26° Sett	27° Sett	28° Sett	29° Sett	30° Sett	31° Sett													
				2° Stato Avanzamento Lavori																																											
				20 mila	40 mila	60 mila	80 mila	100 mila	120 mila	140 mila	160 mila	180 mila	200 mila	220 mila	240 mila	260 mila	280 mila	300 mila	320 mila	340 mila	360 mila	380 mila	400 mila	420 mila	440 mila	460 mila	480 mila	500 mila	520 mila	540 mila	560 mila	580 mila	600 mila														
n°	Lavorazioni VIA TERRA																																														
1	Allestimento cantiere	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
2	Scavi, demolizioni, trasporti e smaltimenti	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
3	Lavori stradali	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
4	Impianto elettrico	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
5	Impianto idrico/fognario	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
6	Smobilizzo del cantiere	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
PIAZZA CASTELLO																																															
7	Allestimento cantiere	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
8	Scavi, demolizioni, trasporti e smaltimenti	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
9	Lavori stradali	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
10	Impianto elettrico	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
11	Impianto idrico/fognario	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
12	Smobilizzo del cantiere	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
VIA RIO																																															
13	Allestimento cantiere	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
14	Scavi, demolizioni, trasporti e smaltimenti	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
15	Lavori stradali	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
16	Impianto elettrico	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
17	Impianto idrico/fognario	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
18	Smobilizzo del cantiere	T. Prev.																																													
		E. Prev.																																													
